Id	Taak	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
0		Molenwijk/Waddenbuurt	593,8 wkn	24-11-20	1-9-32
1		Definitiefase	259,6 wkn	24-11-20	7-4-26
52		Ontwerpfase	80,6 wkn	25-2-25	10-9-26
53		Anterieure overeenkomst met Pré Wonen	12,4 wkn	15-12-25	10-3-26
56		Stedenbouwkundig plan bouwvelden (Waddenstraat)	35,6 wkn	11-6-25	13-2-26
59		Openbare ruimte	38 wkn	10-11-25	31-7-26
64		Besluitvorming	8,6 wkn	15-1-26	17-3-26
69		Procedure één-op-één verkoop/-ruil aan Pré Wonen	25,4 wkn	18-3-26	10-9-26
75		BKP	31,4 wkn	11-8-25	17-3-26
79		Ontwerp gebouwen fase 1 (groot bouwblok)	69,2 wkn	25-2-25	23-6-26
83		Fasedocument	1 wk	3-8-26	7-8-26
85		Voorbereidingsfase (concept: nader af te stemmen)	276,4 wkn	6-7-23	25-12-28
86		Procedure omgevingsplan	155 wkn	6-7-23	27-8-26
134		Verkoopprocedure TOM (transparant, openbaar, marktconform) Terschellingpad 2	144,8 wkn	18-3-26	25-12-28
154		Procedure omgevingsvergunning (BOPA) Fase 1, blok 2	33 wkn	27-3-26	12-11-26
155		Omgevingstafel	13 wkn	27-3-26	25-6-26
156		Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning	0 wkn	25-6-26	25-6-26
157		Behandeltermijn omgevingsvergunning	8 wkn	26-6-26	20-8-26
158		Verlenging behandeltermijn omgevingsvergunning	6 wkn	21-8-26	1-10-26
159		Afgifte vergunning	0 dagen	1-10-26	1-10-26
160		Mogelijkheid tot indienen bezwaren	6 wkn	2-10-26	12-11-26
161		Vergunning onherroepelijk	0 wkn	12-11-26	12-11-26
162		Procedure omgevingsvergunning (OPA) overige blokken	33 wkn	29-5-26	14-1-27
163		Omgevingstafel	13 wkn	29-5-26	27-8-26
164		Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning	0 wkn	27-8-26	27-8-26
165		Behandeltermijn omgevingsvergunning	8 wkn	28-8-26	22-10-26
166		Verlenging behandeltermijn omgevingsvergunning	6 wkn	23-10-26	3-12-26
167		Afgifte vergunning	0 dagen	3-12-26	3-12-26
168		Mogelijkheid tot indienen bezwaren	6 wkn	4-12-26	14-1-27
169		Vergunning onherroepelijk	0 wkn	14-1-27	14-1-27
170		Procedure omgevingsvergunning (binnen BP) Terschellingpad	33 wkn	11-4-28	27-11-28
171		Omgevingstafel	13 wkn	11-4-28	10-7-28
172		Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning	0 wkn	10-7-28	10-7-28
173		Behandeltermijn omgevingsvergunning	8 wkn	11-7-28	4-9-28
174		Verlenging behandeltermijn omgevingsvergunning	6 wkn	5-9-28	16-10-28
175		Afgifte vergunning	0 dagen	16-10-28	16-10-28
176		Mogelijkheid tot indienen bezwaren	6 wkn	17-10-28	27-11-28
177		Vergunning onherroepelijk	0 wkn	27-11-28	27-11-28
178		Fasedocument	1 wk	28-11-28	4-12-28
179		Opstellen fasedocument inclusief pva, capaciteit en financien	1 wk	28-11-28	4-12-28
180		Realisatiefase (nog te bepalen)	309 wkn	1-10-26	1-9-32
181		Planning Pré Wonen	286,2 wkn	1-10-26	25-3-32
182		Oost (fase 1) Start voor 1/5/2027	122 wkn	1-10-26	31-1-29
183		Sloop	26 wkn	1-10-26	31-3-27
184		Bouw	96 wkn	1-4-27	31-1-29
185		Midden (fase 2)	116 wkn	2-10-28	20-12-30
186		Sloop	26 wkn	2-10-28	30-3-29
187		Bouw	90 wkn	2-4-29	20-12-30
188		West (fase 3)	108 wkn	1-3-30	25-3-32
189		Sloop	26 wkn	1-3-30	29-8-30
190		Bouw	82 wkn	30-8-30	25-3-32
191		Aanleg openbare ruimte door RCP	200 wkn	2-11-28	1-9-32
192		Terschellingpad	121 wkn	28-11-28	24-3-31
193		Voorbereiding bouw Terschellingerpad	17 wkn	28-11-28	26-3-29
194		Start sloop+bouw Terschellingspad	0 mndn	26-3-29	26-3-29
195		Sloop+bouw Terschellingspad	104 wkn	27-3-29	24-3-31

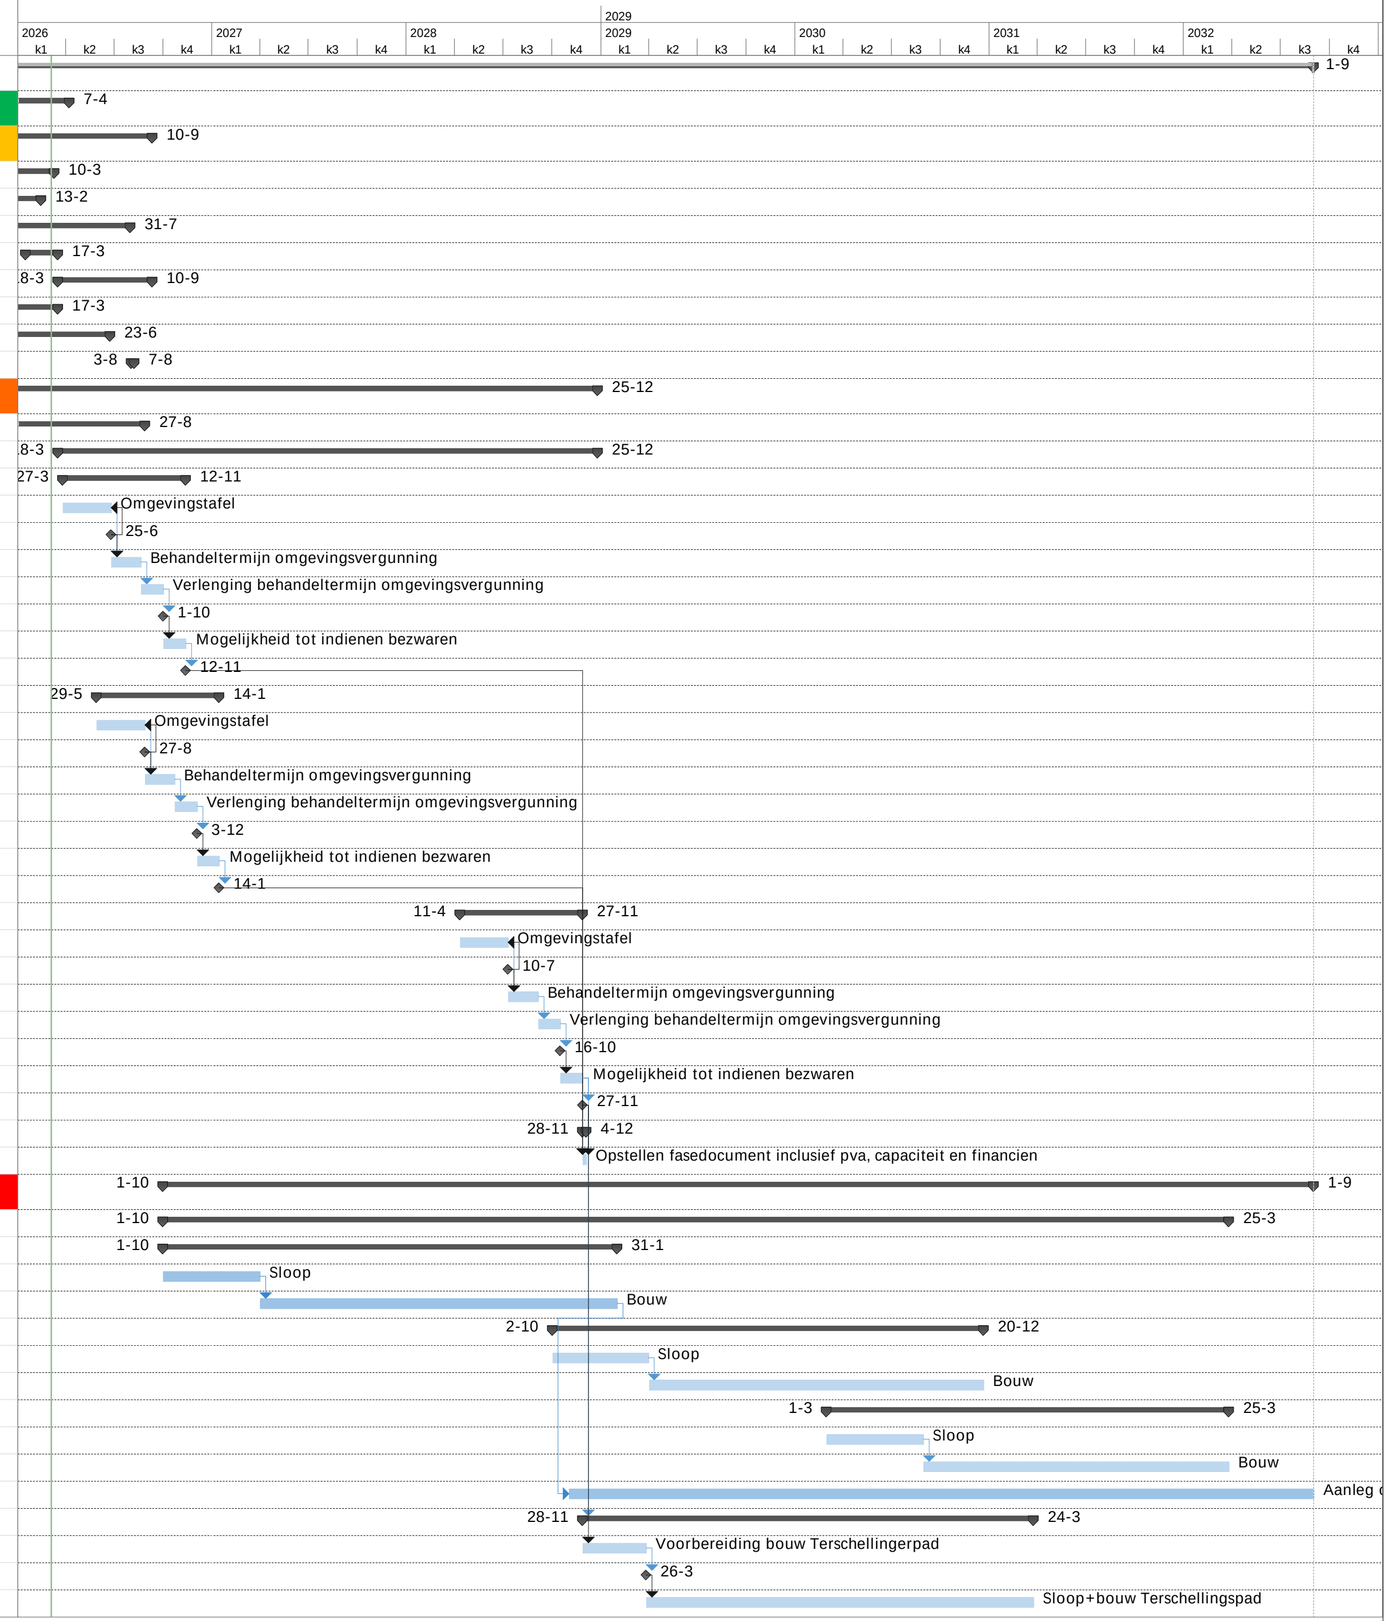

Project: Molenwijk/Waddenbu
Datum: 5-3-26

Taak | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Deadline | Kritiek
