| Id | Taaknaam | Duur | Start | Eind |
|---|---|---|---|---|
| 0 | **Trafostation BBRWEG** | **460,2 wkn** | **don 1-4-21** | **don 20-3-31** |
| 1 | **Trafostation BBRWEG** | **460,2 wkn** | **don 1-4-21** | **don 20-3-31** |
| 2 | **Algemeen** | **460,2 wkn** | **don 1-4-21** | **don 20-3-31** |
| 3 | **Mijlpalen** | **460,2 wkn** | **don 1-4-21** | **don 20-3-31** |
| 4 | **Mijlpalen** | **460,2 wkn** | **don 1-4-21** | **don 20-3-31** |
| 6 | Start Ontwerp- / Voorbereidingsfase | 0 wkn | woe 18-2-26 | woe 18-2-26 |
| 7 | Start Realisatiefase | 0 wkn | vri 10-3-28 | vri 10-3-28 |
| 8 | Eerste oplevering | 0 wkn | don 5-9-30 | don 5-9-30 |
| 9 | Laatste oplevering | 0 wkn | don 5-9-30 | don 5-9-30 |
| 10 | Start Nazorgfase | 0 wkn | vri 6-9-30 | vri 6-9-30 |
| 11 | Afsluiting project | 0 wkn | don 20-3-31 | don 20-3-31 |
| 12 | **Kapstok** | **288,4 wkn** | **maa 1-7-24** | **din 15-10-30** |
| 16 | **Fasedocument** | **6 wkn** | **woe 18-2-26** | **din 31-3-26** |
| 17 | Opstellen, toetsen, afstemmen | 4 wkn | woe 18-2-26 | din 17-3-26 |
| 18 | APO | 0 dagen | din 31-3-26 | din 31-3-26 |
| 19 | **Dechargedocument** | **5,6 wkn** | **vri 6-9-30** | **din 15-10-30** |
| 20 | Opstellen, toetsen, afstemmen | 4 wkn | vri 6-9-30 | don 3-10-30 |
| 21 | APO | 0 dagen | din 15-10-30 | din 15-10-30 |
| 54 | **Kaderstellendefase (Definitiefase)** | **49,4 wkn** | **woe 16-4-25** | **don 7-5-26** |
| 65 | **Anterieure overeenkomst en uitvoeringskrediet** | **32 wkn** | **vri 12-9-25** | **don 7-5-26** |
| 68 | Aanpassen | 5 wkn | vri 19-12-25 | don 5-2-26 |
| 69 | APO | 0 wkn | din 17-2-26 | din 17-2-26 |
| 70 | Staf | 0 wkn | maa 2-3-26 | maa 2-3-26 |
| 71 | College B&W | 0 wkn | din 10-3-26 | din 10-3-26 |
| 72 | Presidium | 0 wkn | don 9-4-26 | don 9-4-26 |
| 73 | Raadsstemming (Geen sessie nodig?) | 0 wkn | don 7-5-26 | don 7-5-26 |
| 74 | **Uitwerkingsfase (Ontwerpfase)** | **58 wkn** | **woe 18-2-26** | **din 11-5-27** |
| 75 | **UAV-GC contract aanbesteding (T/L)** | **24 wkn** | **woe 18-2-26** | **din 1-9-26** |
| 76 | Aanbesteding t/m gunning | 24 wkn | woe 18-2-26 | din 1-9-26 |
| 77 | **Uitvoeringsgereed plan (T/L)** | **24 wkn** | **woe 2-9-26** | **din 2-3-27** |
| 78 | Uitwerken DO tot uitvoeringsgereed plan | 24 wkn | woe 2-9-26 | din 2-3-27 |
| 79 | **Inrichtingsplan (T/L)** | **10 wkn** | **woe 3-3-27** | **din 11-5-27** |
| 80 | Beoordeling inrichtingsplan Q-team | 10 wkn | woe 3-3-27 | din 11-5-27 |
| 81 | **Procedures en vergunningen** | **169,16 wkn** | **vri 24-10-25** | **vri 8-6-29** |
| 82 | **Onteigeningsprocedure** | **169,16 wkn** | **vri 24-10-25** | **vri 8-6-29** |
| 107 | **Schadeloosstellingsprocedure** | **41 wkn** | **vri 30-4-27** | **don 23-3-28** |
| 114 | **Inschrijving onteigeningsakte** | **12 wkn** | **vri 24-3-28** | **don 15-6-28** |
| 117 | **Wijziging omgevingsplan 1e fase (STOP/TPOD) - Voorbereiding aanvraag** | **3,6 wkn** | **din 19-5-26** | **vri 12-6-26** |
| 118 | Opstellen voornemen | 2 wkn | din 19-5-26 | din 2-6-26 |
| 119 | APO vaststellen voornemen | 0 wkn | din 2-6-26 | din 2-6-26 |
| 120 | Staf vaststellen voornemen | 0 wkn | maa 8-6-26 | maa 8-6-26 |
| 121 | B&W vaststellen voornemen | 0 vwkn | don 11-6-26 | don 11-6-26 |
| 122 | Aanleveren voor publicatie voornemen (uiterlijk duidelijkheid partic | 0 vwkn | vri 12-6-26 | vri 12-6-26 |
| 123 | **Wijziging omgevingsplan 1e fase (STOP/TPOD) - Voor ontwerp** | **39,6 wkn** | **vri 21-11-25** | **din 6-10-26** |
| 124 | Opstellen, toetsen, afstemmen voorontwerp | 16 wkn | vri 21-11-25 | don 26-3-26 |
| 125 | Aanleveren eerste concept regels en verbeelding | 0 wkn | don 26-3-26 | don 26-3-26 |
| 126 | 1e toets/beoordeling | 3 vwkn | don 26-3-26 | don 16-4-26 |
| 127 | Ontwerp aanpassen | 10 vwkn | don 16-4-26 | don 25-6-26 |
| 128 | Vooroverleg belanghebbenden en participatie | 6 wkn | vri 26-6-26 | don 3-9-26 |
| 129 | Ontwerp aanpassen | 4 vwkn | don 3-9-26 | don 1-10-26 |
| 130 | College | 0 wkn | din 6-10-26 | din 6-10-26 |
| 131 | **Wijziging omgevingsplan 1e fase (STOP/TPOD) - Ontwerp** | **13,8 wkn** | **din 6-10-26** | **maa 25-1-27** |
| 132 | Aanleveren APO (woensdag) | 0 wkn | din 6-10-26 | din 6-10-26 |
| 133 | APO vaststellen aangepast ontwerpbesluit (dinsdag) | 0 wkn | maa 12-10-26 | maa 12-10-26 |
| 134 | Staf vaststellen ontwerpbesluit (maandag) | 0 wkn | vri 16-10-26 | vri 16-10-26 |
| 135 | B&W vaststellen ontwerpbesluit (dinsdag) | 0 wkn | maa 26-10-26 | maa 26-10-26 |
| 136 | Deadline: Toekennen hoofdstuknummer coördinator systematiek o | 1 wk | din 20-10-26 | maa 26-10-26 |
| 137 | Aanleveren voor publicatie incl. publicatie ProjectMER | 1 vwk | maa 26-10-26 | maa 2-11-26 |
| 138 | Terinzagelegging ontwerpbesluit voor zienswijzen | 6 wkn | din 3-11-26 | maa 14-12-26 |
| 139 | Opstellen nota van beantwoording zienswijzen | 6 vwkn | maa 14-12-26 | maa 25-1-27 |
| 140 | Aanpassen ontwerpbesluit n.a.v. zienswijzen (indien van toepassir | 6 vwkn | maa 14-12-26 | maa 25-1-27 |
| 141 | **Wijziging omgevingsplan 1e fase (STOP/TPOD) - Vaststelle** | **18 wkn** | **maa 25-1-27** | **maa 31-5-27** |
| 142 | APO vaststellen besluit (dinsdag 9.00-11.00u) | 0 dagen | maa 25-1-27 | maa 25-1-27 |

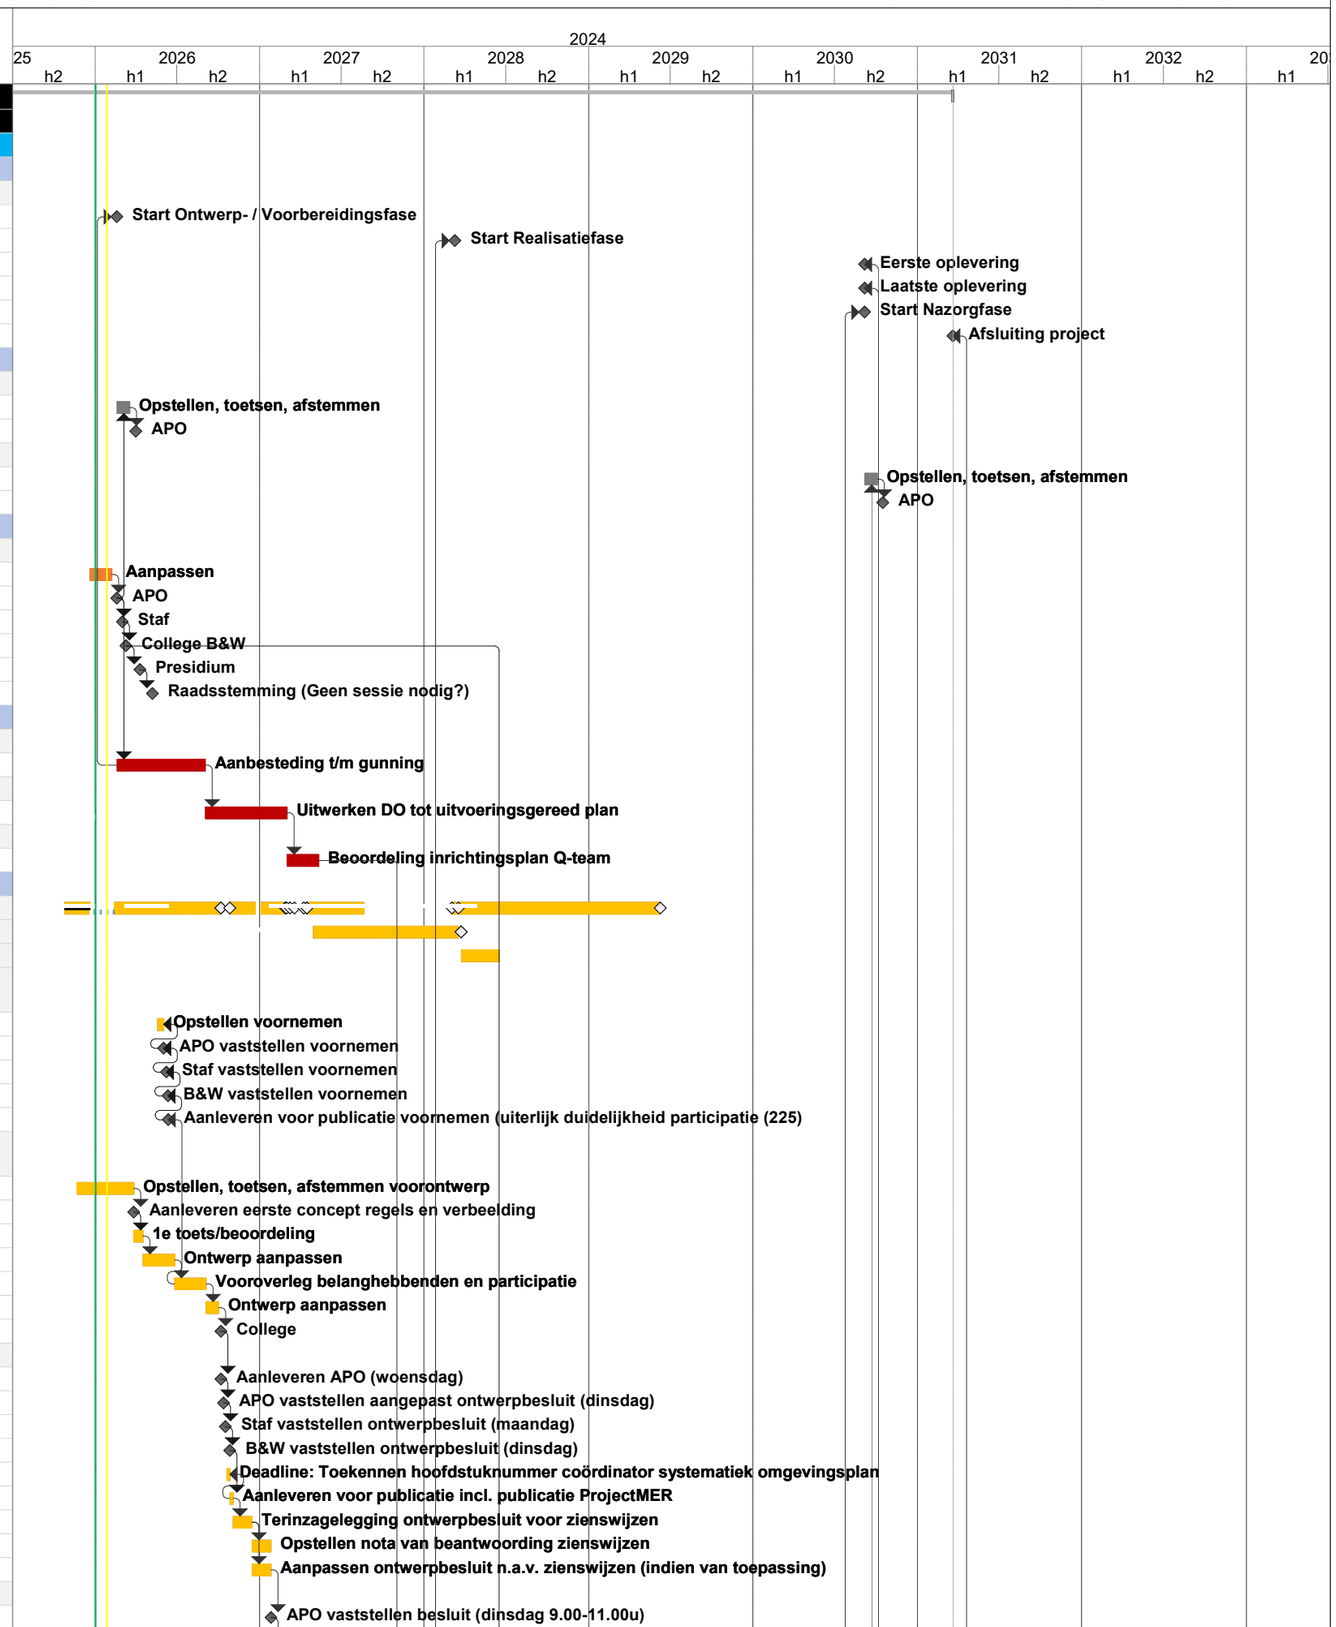
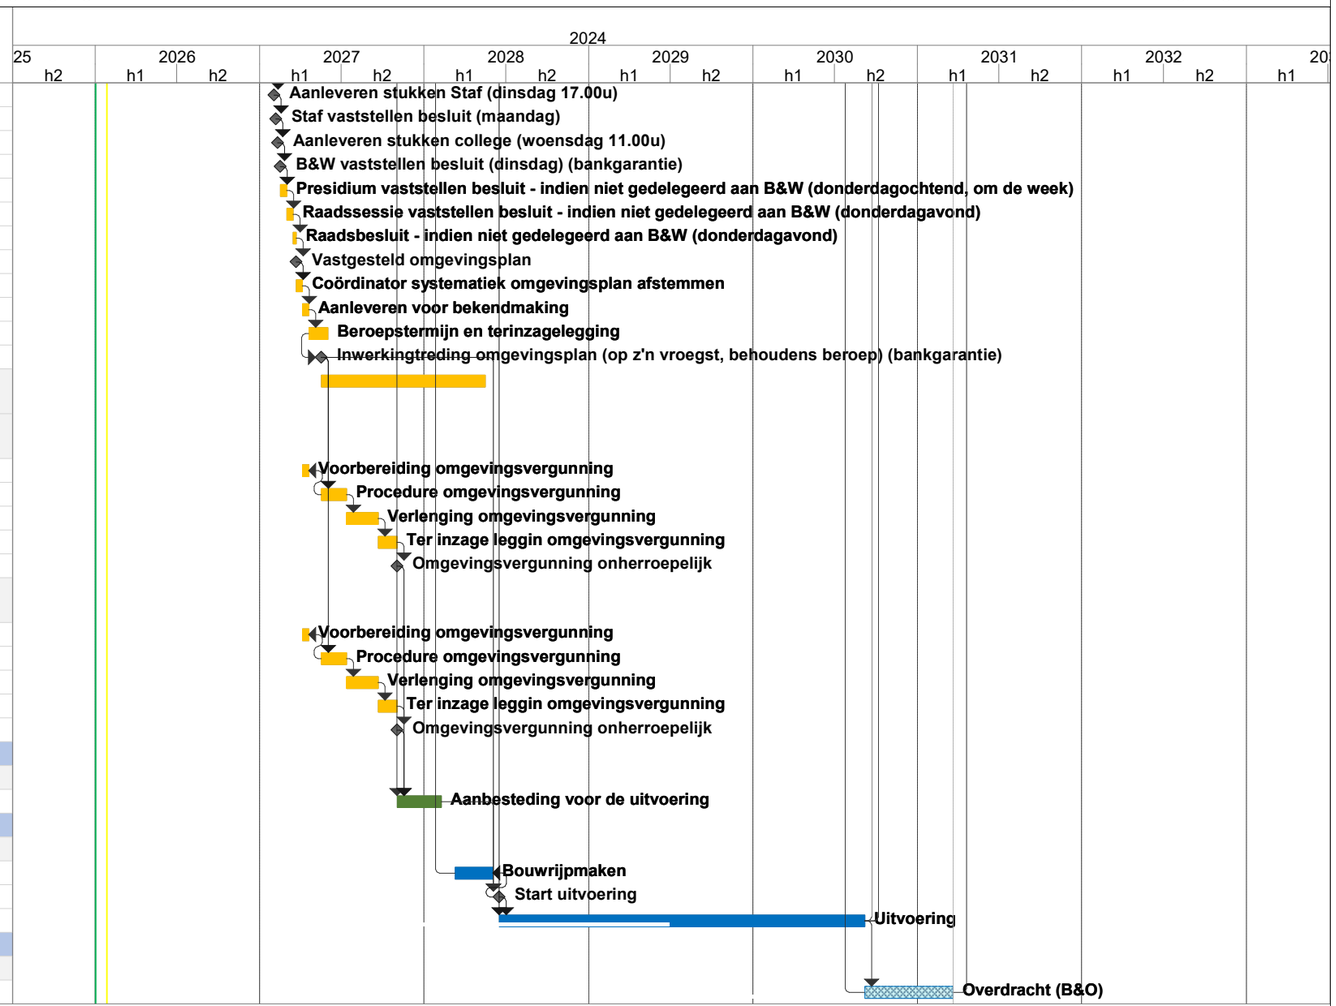
| Id | Taaknaam | Duur | Start | Eind |
|---|---|---|---|---|
| 143 | Aanleveren stukken Staf (dinsdag 17.00u) | 0 dagen | maa 1-2-27 | maa 1-2-27 |
| 144 | Staf vaststellen besluit (maandag) | 0 dagen | vri 5-2-27 | vri 5-2-27 |
| 145 | Aanleveren stukken college (woensdag 11.00u) | 0 dagen | din 9-2-27 | din 9-2-27 |
| 146 | B&W vaststellen besluit (dinsdag) (bankgarantie) | 0 dagen | maa 15-2-27 | maa 15-2-27 |
| 147 | Presidium vaststellen besluit - indien niet gedelegeerd aan B&W (c | 2 wkn | din 16-2-27 | maa 1-3-27 |
| 148 | Raadssessie vaststellen besluit - indien niet gedelegeerd aan B&W | 2 wkn | din 2-3-27 | maa 15-3-27 |
| 149 | Raadsbesluit - indien niet gedelegeerd aan B&W (donderdagavon | 1 wk | din 16-3-27 | maa 22-3-27 |
| 150 | Vastgesteld omgevingsplan | 0 wkn | maa 22-3-27 | maa 22-3-27 |
| 151 | Coördinator systematiek omgevingsplan afstemmen | 2 vwkn | maa 22-3-27 | maa 5-4-27 |
| 152 | Aanleveren voor bekendmaking | 2 wkn | din 6-4-27 | maa 19-4-27 |
| 153 | Beroepstermijn en terinzagelegging | 6 vwkn | maa 19-4-27 | maa 31-5-27 |
| 154 | Inwerkingtreding omgevingsplan (op z'n vroegst, behoudens beroe | 0 vwkn | maa 17-5-27 | maa 17-5-27 |
| 155 | **Wijziging omgevingsplan 1e fase (STOP/TPOD) - Beroepsprocedure** | **46 wkn** | **maa 17-5-27** | **maa 15-5-28** |
| 157 | **Omgevingsvergunning en (indien nodig) milieuvergunning (Opstellen L)** | **26 wkn** | **din 6-4-27** | **maa 1-11-27** |
| 158 | Voorbereiding omgevingsvergunning | 2 wkn | din 6-4-27 | din 20-4-27 |
| 159 | Procedure omgevingsvergunning | 8 wkn | din 18-5-27 | maa 12-7-27 |
| 160 | Verlenging omgevingsvergunning | 6 wkn | din 13-7-27 | maa 20-9-27 |
| 161 | Ter inzage leggin omgevingsvergunning | 6 wkn | din 21-9-27 | maa 1-11-27 |
| 162 | Omgevingsvergunning onherroepelijk | 0 wkn | maa 1-11-27 | maa 1-11-27 |
| 163 | **Omgevingsvergunning technische bouwactiviteit (Opstellen T)** | **26 wkn** | **din 6-4-27** | **maa 1-11-27** |
| 164 | Voorbereiding omgevingsvergunning | 2 wkn | din 6-4-27 | din 20-4-27 |
| 165 | Procedure omgevingsvergunning | 8 wkn | din 18-5-27 | maa 12-7-27 |
| 166 | Verlenging omgevingsvergunning | 6 wkn | din 13-7-27 | maa 20-9-27 |
| 167 | Ter inzage leggin omgevingsvergunning | 6 wkn | din 21-9-27 | maa 1-11-27 |
| 168 | Omgevingsvergunning onherroepelijk | 0 wkn | maa 1-11-27 | maa 1-11-27 |
| 169 | **Uitwerkingsfase (Realisatiefase)** | **12 wkn** | **din 2-11-27** | **maa 7-2-28** |
| 170 | **Aanbesteding** | **12 wkn** | **din 2-11-27** | **maa 7-2-28** |
| 171 | Aanbesteding voor de uitvoering | 12 wkn | din 2-11-27 | maa 7-2-28 |
| 172 | **Uitwerkingsfase (Realisatiefase)** | **114 wkn** | **vri 10-3-28** | **don 5-9-30** |
| 173 | **Uitvoering (T/L)** | **114 wkn** | **vri 10-3-28** | **don 5-9-30** |
| 174 | Bouwrijpmaken | 12 wkn | vri 10-3-28 | vri 2-6-28 |
| 175 | Start uitvoering | 0 wkn | don 15-6-28 | don 15-6-28 |
| 176 | Uitvoering | 100 wkn | vri 16-6-28 | don 5-9-30 |
| 177 | **Nazorgfase** | **26 wkn** | **vri 6-9-30** | **don 20-3-31** |
| 178 | **Overdracht (Indien nodig)** | **26 wkn** | **vri 6-9-30** | **don 20-3-31** |
| 179 | Overdracht (B&O) | 26 wkn | vri 6-9-30 | don 20-3-31 |
